
BIOBAUERNHOF MIT HOTEL · WINDISCHGARSTEN


Prüfung der Elektroanlage



Geöffnetes Gehäuse mit Elektronik und Anschlüssen

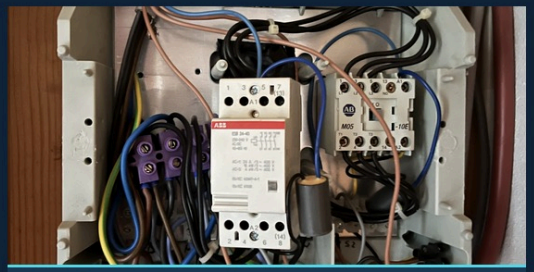

Geöffneter Verteiler

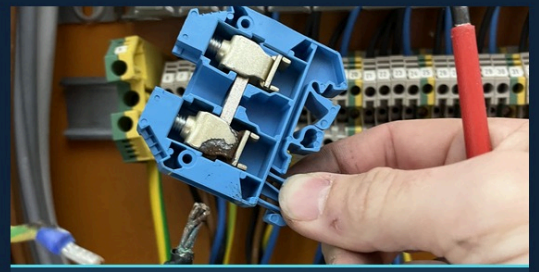

Anschlussklemmen im Detail



Pumpenmotor



Sicherungsverteilung



Steckdose im Innenbereich



Steckdose mit Klappdeckel




Anschlüsse im Technikbereich




Einbauten im Wandschrank

© Christoph Wöss


Verteilerschränke und Messtechnik

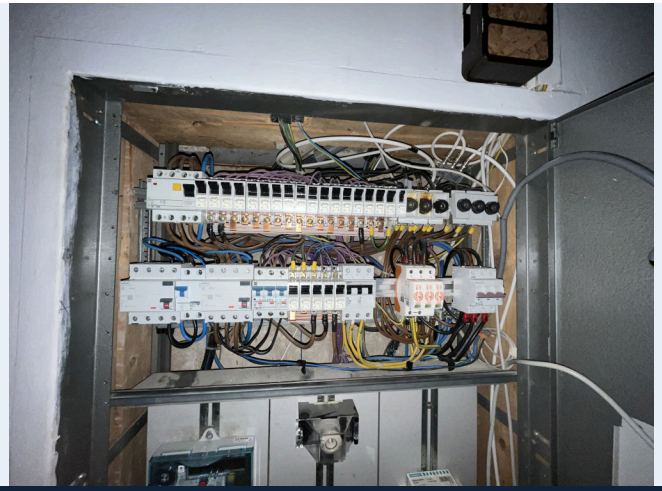

Geöffneter Verteilerschrank

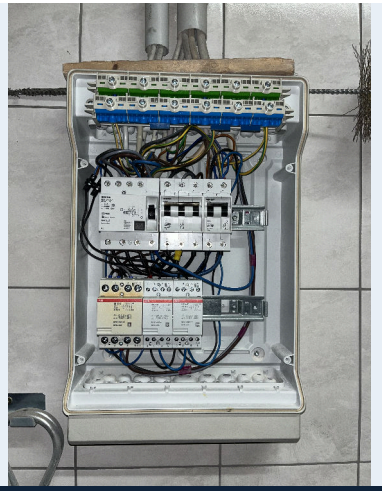

Kleinverteiler mit Schutzgeräten

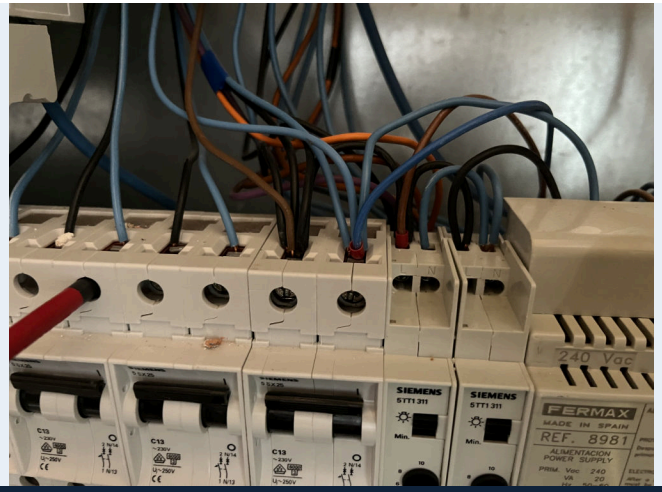

Verdrahtung und Schutzgeräte



Installationstester im Einsatz

Prüfprotokoll für die Elektroanlage

Leere Vorlage zur Bearbeitung durch die prüfende Fachkraft. Messwerte und Beurteilung sind offen.

Objekt
Biobauernhof mit Hotel, Windischgarsten

Prüfdatum / prüfende Fachkraft
_____

Anlage / Verteiler / Prüfgrenzen
_____

Netzsystem / Schutzmaßnahmen
_____

Prüfgerät / Seriennummer
_____

Unterlagen / Beurteilungsgrundlagen
_____

Prüfschritte und Dokumentation

Besichtigung	Verteiler, Kennzeichnung, Abdeckungen, Zugänglichkeit, sichtbarer Zustand _____
Erprobung	Funktion von Schalt- und Schutzeinrichtungen, soweit anwendbar _____
Messung	Je nach Anlage: PE-/PA-Durchgängigkeit, Isolation, Abschaltbedingungen, RCD, Erdung _____
Messwertblatt je Stromkreis	Verteiler/Stromkreis, Verfahren, Messwert mit Einheit, Grenzwert, Bewertung _____
Mängel und Maßnahmen	Ort, Befund, Maßnahme, Verantwortlichkeit und Frist _____
Abschluss	Gesamtbeurteilung, Einschränkungen, nächste Prüfung, Datum und Unterschrift _____

Den Prüfumfang, die anwendbaren Grenzwerte und die Beurteilung legt die prüfende Fachkraft anhand der konkreten Anlage fest.

Quelle: OVE E 8101, Teil 6 „Prüfung“ | ove.at/ove-standardization/normen-produkte/ove-e-8101/
